



א' 26/11/2023

בית ספר מקיף ג'

הצוללים 3 אשדוד רובע ד

770461

089564100

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-770461

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר מקיף ג'

כתובת המוסד-הצוללים 3

טלפון המוסד-089564100

פרטי המנהל/ת-גילה שמעוני

תאריך המבדק-ה' 2/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-לא

פרטי הבדק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב- 1 -
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5 -
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק/חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1 -
- תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



מבנה מרכזי- כיתות הלימוד/ מנהלה/ אגפי - (39) אין מגן אצבעות מתאים בדלתות. מפגע גורף. מגיני אצבעות לא תקינים - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות -1-שירותים/ דלת כניסה וחדרי ספח. מפגע גורף
אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע
32: 6-23-28/1/2023 -דלתות-שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה





לא יהיו מפגעי תשתית בבניין -2-ליד דלת הכניסה/ מול חדר המורים-פינת מסתור . שטח צר ללא סידורי גידור מתאימים- - -
 5.10-28/1/2023 6: 37 מפגעים קבועים וניידים- ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



כבלי חשמל -0-קומת כניסה- ברחבה הנמצאת בגב האודיטוריום- חוטי חשמל גלויים. חוטי חשמל בהישג ידם של התלמידים- - -
 9.9-28/1/2023 15: 20 חיווט וכבלי חשמל-קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, -2--חדר 06- קומה 1.-חלקי טיח שהתפרקו מהקיר- - -
 5.10-28/1/2023 15: 25- מפגעים קבועים וניידים.- סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



כל אביזרי החשמל -0-חדר 04 בקומה מינוס 1.-מפסק חשמל לא מחובר במקום. חוטי חשמל גלויים בהישג יד. סכנת התחשמלות- - -
 9.5-28/1/2023 15: 28- מפסקים ושקעים.- יהיו שלמים ומקובעים למקומם



גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה -1-כיתה 04 - קומה 1- / כיתה 30 - קומה 2+ / מפגע גורף-גופי תאורה לא מוגנים מפגיעה פיזית- - -
 9.8-28/1/2023 15: 31- מנורות וגופי תאורה.- פיזית

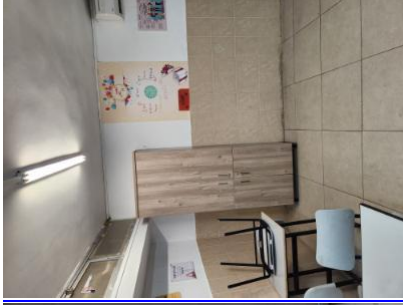



כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות 0-כיתה 36-. חוטי חשמל גלויים בתוך קופסה לא תקינה. חוטי חשמל בהישג יד- - -
 9.9-28/1/2023 16:00 חיווט וכבלי חשמל-מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



- ארונות, ספריות וכונייות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-חדרים : 26 / 27 / 13 / 03 / מפגע גורף-. ארונות לא מקובעים- - -
 5.5-28/1/2023 16:04 מופעים קבועים וניידים






חומרי ניקוי, חיטוי וצריבה יאוחסנו בארון סגור, משולט -1-קומה שניה- שירותי בנות-חומרי ניקוי בהישג ידם של תלמידים - - -
 16:07 25.6-28/1/2023 חומרים- באזהרה מתאימה



בחלל/חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנעול בהלה. אם -1-מבנה כתות ז/ספרייה-דלת היציאה ללא מנגנון בהלה- - -
 8:06 4.14-2/3/2023 הכנה למילוט-ישנן מספר כנפיים לדלתות – בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות -1-דלת כניסה ראשית מבנה כתות ז ללא מגן אצבעות-חוסר במגן אצבעות- - -
 8:09 5.23-2/3/2023 דלתות- הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
 הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף

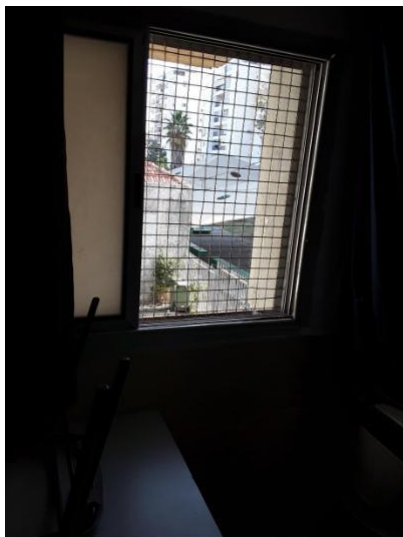

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים -1-כתות מסוגות-כתות מסורגות ללא פתח חירום , ללא מפתח, ללא שילוט- - -
 8: 16 5.10-2/3/2023 -מפגעים קבועים וניידים-.במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים




מיקום עמדות כיבוי אש יוצבו בצורה שאינה מסכנת את העוברים . הארונות יהיו -2-מבנה כתות ז-נוילת מים מגולגלון כיבוי אש- - -
 8: 20 4.2-2/3/2023 -ציוד ומטפי כיבוי אש-.שלמים ללא קצוות חדים . פתיחת הארון תהיה מהירה בכל מצב



- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-פרוזדור כתות ז-מצנן מין מחובר באילתור חשמל-סכנת התחשמלות- - -
 8: 22 9.5-2/3/2023 -מפסקים ושקעים



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן 1-שרותי בנות מבנה כתתות ז-חוסר במגן אצבעות - - -
אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא
5.23-2/3/2023 8:25 דלתות- ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה

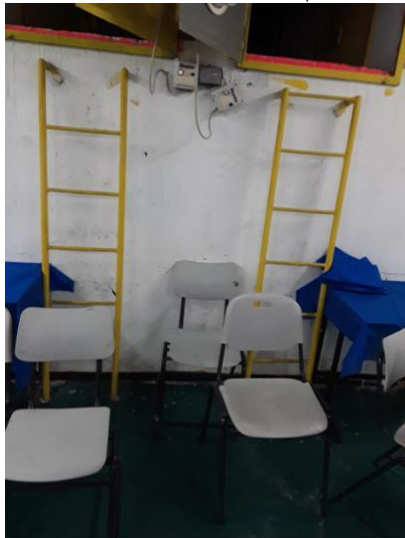

חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אוורור, 1-מקלטים-גורף-סולמות במקלט ללא מיגון - - -
6.5-2/3/2023 8:29 ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח וייבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם



ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי 1-מקלט כתות ז-מטף כיבוי אש פג תוקף - - -
4.4-2/3/2023 8:31 ציוד ומטפי כיבוי אש-וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523



9-5-2/3/2023 מפסקים ושקעים.- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-ארון חשמל-חוסר בשילוט לארון חשמל- - -

8: 34



בחלל /חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה -1-דלת יציאה ראשית מבנה כתות ז מערבית-דלת קראשית לכוון מערב ללא מנגנון בהלה- - -
4-14-2/3/2023 8: 38 הכנה למילוט-נדרש להתקין מנעול בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות – בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנעול בהלה




הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי 1-ספרייה-דלת ללא מגן אצבעות- - -
 הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט
 5.23-2/3/2023 8:41 דלתות- ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה




ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש 1-ספרייה-מטף כיבוי ללא תוקף- - -
 4.4-2/3/2023 8:46 ציוד ומטפי כיבוי אש-בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523



בחלל/חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנועול בהלה. 1-מבנה מרכזי-דלתות יציאה ראשיות ללא מנגנון בהלה-גורף- - -
 4.14-2/3/2023 9:00 הכנה למילוט-אם ישנן מספר כנפיים לדלתות – בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנועול בהלה

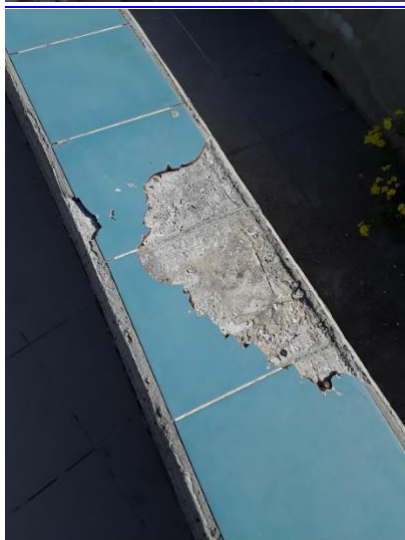

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון 2-אמפי-מושבים שבורים- - - -
5.10-2/3/2023 9: 03 מפגעים קבועים וניידים- "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

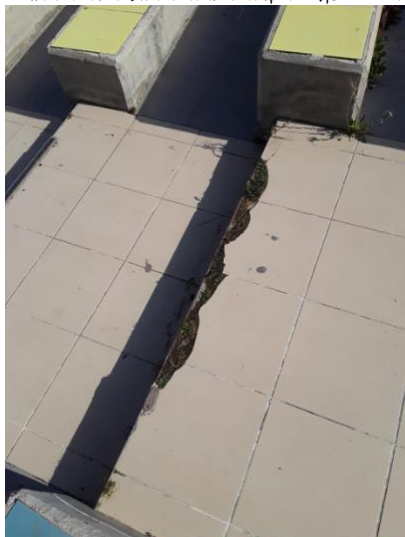

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") 1-אמפי-מדרגות שבורות- - - -
5.10-2/3/2023 9: 06 מפגעים קבועים וניידים- בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים -1-אמפי-מסגרת של קופסאות חשמל מאחורי הקיר של הבמה שבורה - - -
 5.10-2/3/2023 9: 09 מפגעים קבועים וניידים- במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון -1-אולם ספורט-סימני ריפיון בתקרה - - -
 5.10-2/3/2023 9: 15 מפגעים קבועים וניידים- (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין -1-אולם ספורט-עמודים של משחנכדורעף מונחים בבפינת האולם-בעמודים אלמנטים חדים - - -
 5.10-2/3/2023 9: 18 מפגעים קבועים וניידים- ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו -2-גדר המוסד-חלק מהגדר בנויה מגד רשת עם אלמנטים מחדים בחלק העליון- - -
 21: 9: 2/3/2023 3.30-גדר-אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה



מנורות וגופי - גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית-1-כתות מבנה מרכזי -גורף בכל בית הספר-חלק מגופי התאור לל מכסה מגן- - -
 28: 9: 2/3/2023 9.8-תאורה



4.10-2/3/2023 9: 30-חדרי מדרגות-פני השלח יהיו מחוספסים למניעת החלקה-1-מבנה מרכזי-חוסר בפסים למניעת החלקה- - -



5-2/3/2023 9:37 וניידים

מפגעים קבועים - ארונות, ספריות וכוונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-מבנה ראשי חדר 5-ארון מתכת לא מקובע- - -



5-10-2/3/2023 9:44 מפגעים קבועים וניידים- ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות 1-שרותים שכבה ט בניין מרכזי-סדק בקיר, חיפוי ניתק מהקיר, סימני רטיבות בקירות- - -





מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל-1-אודיטוריום-חוסר בשילוט של תפוסת האולם. - - -
 17-2/3/2023 9: 48-4-הכנה למילוט-; כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום



9-5-2/3/2023-מפסקים ושקעים-כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-אודיטוריום-שלט "יציאה" לא תקין- - -
 9: 51




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, 1-כתות עם תקרה מינרלית-יחידות מינרליות מחוץ לתושבת- - -
 10-2/3/2023 9: 55-5-מפגעים קבועים וניידים-רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים -1-בניין חרכזי שכבה י ליד שרותי בנות-חוסר בזכויות לחלון בפרוזדור- - -
 5.10-2/3/2023 9: 58 מפגעים קבועים וניידים- במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



-4.15-הכנה למילוט- שני פתחי מילוט לפחות בחדר שתפוסתו 50 איש ומעלה-1-שרותי בנים שכבה יב קומה 2-חיפוי שבור- - -
 2/3/2023 10: 08

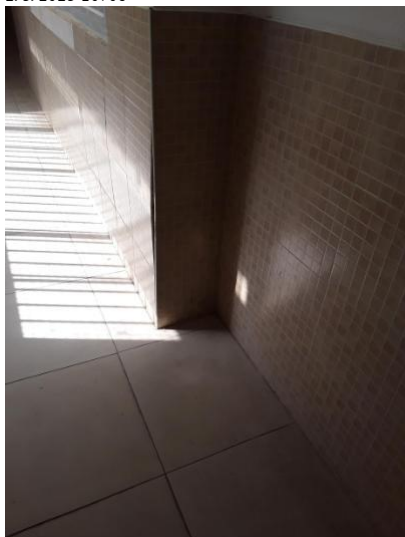

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, -1-פרוזדור מעבדות קומה א-בניין מרכזי-חיפוי הקיר עומד ליפול- - -
 5.10-2/3/2023 10: 12 מפגעים קבועים וניידים- רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

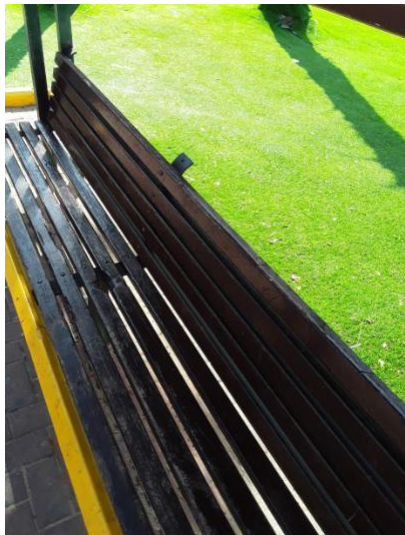




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני 1-חצר המוסד-ספסל בחצר חסר לוח עץ- - -
 5.10-2/3/2023 10: 20 מפגעים קבועים וניידים- רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או 1-חצר מעבר בין שכבה ח לחדר צילום-ריצוף שוקע- - -
 3.1-2/3/2023 10: 24 תשתיות- שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



9.5-2/3/2023 10: 26 מפסקים ושקעים- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-כתה ח7-גוף תאורה נוטה ליפול- - -






הידיות, המנעולים או חיפויים "(רוזטות)" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת -1-דלת אולם תלמידים-מנגנון הדלת לא תקין- - -
5.24-2/3/2023 10:40 -דלתות-. ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון -1-כתה ח4-סימני רטיבות בקיר הכתה- - -
5.10-2/3/2023 10:42 -מפגעים קבועים וניידים-. (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



9.5-2/3/2023 10: 44 - מפסקים ושקעים - כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם - 1-ח-2-שקע חשמל גלוי - - -

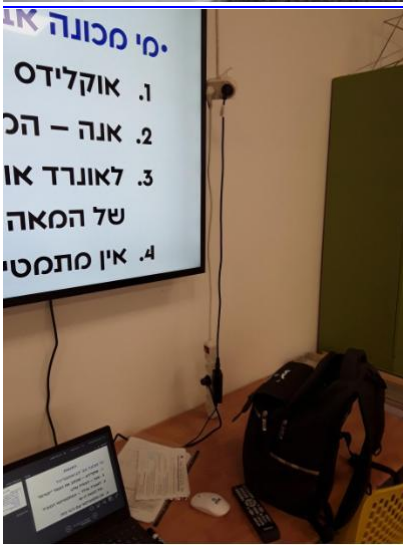

2/3/2023 10: 49

9.5- מפסקים ושקעים - כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם - 1-כתה למטמטיקה-אילתורי חשמל בלוח הכתה- - -



10: 51

5.5-2/3/2023 - מפגעים קבועים וניידים - ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-כתת שילוב-ארון לא מקובע- - -



באגף חדרי מעבדות בו שלוש מעבדות ויותר יוקצה מחסן כימיקלים נפרד. 1-מעבדה לכימיה-קיים חומר המיועד לפינוי ולא פונה- - -
12.6-2/3/2023 11:03-כימיקלים-דלתות המחסן תצוידנה במנעול צילינדר. כך יהיה מחסן כימיקלים למעבדה שבה יש מגמה לכימיה או מגמה ללבורנטים
