



א' 26/11/2023

בית ספר מקיף י"א

שוחם 2 אשדוד רובע יז

620005

088592559

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-


סמל המוסד-620005
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר מקיף י"א
כתובת המוסד-שוחם 2
טלפון המוסד-088592559
פרטי המנהל/ת-ליבנת זיק
תאריך המבדק-א' 26/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-לא
פרטי הבודק-תומר משה

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים
- ✓ - גז ראדון-YEAR פעם ב- 1 -
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5 -
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים
- ✓ - מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1 -
- ✓ - תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

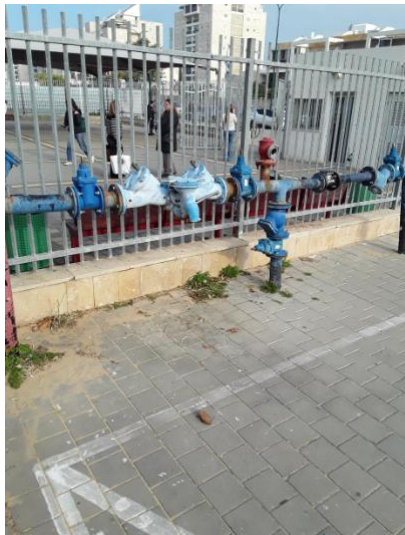


לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, 1-חצר חיצונית-גמל מים עם אלמנטים בולטים - - -
8: 02 5.10-26/2/2023 מפגעים קבועים וניידים.- סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני 1-שכבה ו יציאה לפטיו-ריצוף שוקע- - -
8: 06 5.10-26/2/2023 מפגעים קבועים וניידים.- רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון 1-חצר שכבה י-ריצוף שוקע- - -
8: 14 5.10-26/2/2023 מפגעים קבועים וניידים.- "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

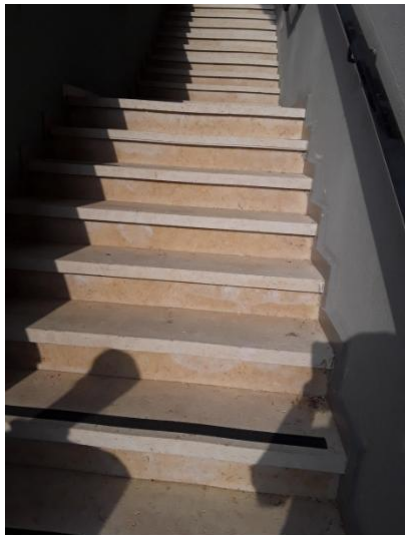


השבילים משערי הכניסה לבניין, דרכי הגישה והשטחים בחצר – כל אלה -2-מדרגות לשכבה יב-חוסר בפסים למניעת החלקה- - -
 8: 19 3.22-26/2/2023 שבילים-יהיו סלולים או מרוצפים או כבושים, ללא מהמורות ובליטות, ופניהם מחוספסים, למניעת החלקה

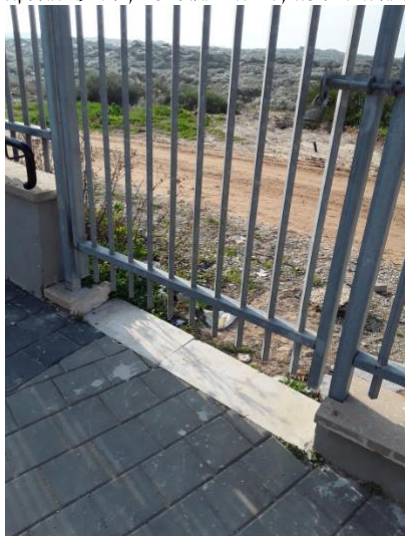

יוגדר שטח לרכב חירום כולל דרך גישה מתאימה וללא -1-שער חירום לכוון דרום-גטבה השער מעל הקרקע כ 20 ס"מ- - -
 8: 24 3.16-26/2/2023 ארגון החצר-מכשולים מהשער המיועד



קירות האולם וחומרי הגימור יהיו חלקים וללא בליטות עד לגובה של 2 מ' -1-מגרש כדורסל/רגל-עמודי סל ללא מיגון- - -
 8: 27 11.4-26/2/2023 קירות-מהרצפה. הפינות של הקירות והעמודים שבהן יהיו קטומים

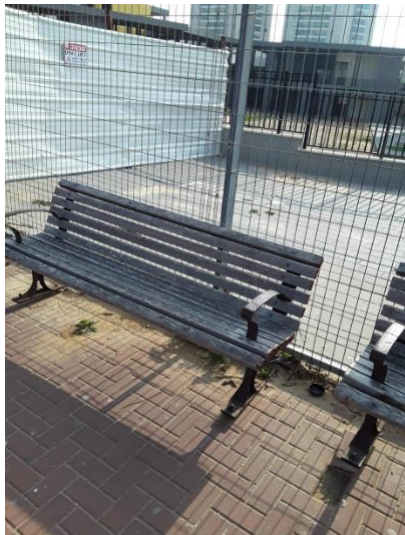

26/2/2023 8: 34

-3.52-מגרשי ספורט-מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים-1-מגרש כדורסל-ספסלי ישיבה לא מקובעים- - -



-לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, -1-מדרגות מאחורי מבנה ו מול מגרש הספורט-ריצוף שוקע- - -

5.10-26/2/2023 8: 37-מפגעים קבועים וניידים-רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



-לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט -1-שרותים קומה ב שכבה יב-מדרגה בדלת כניסה/יציאה ראשית של השרותים- - -

5.10-26/2/2023 8: 53-מפגעים קבועים וניידים-סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



26/2/2023 8:55

9.5-מפסקים ושקעים.- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים במקומם-1-מרפסת שכבה יב קומה ב-פנס נוטה ליפול- - -



26/2/2023 9:00

5.5-מפגעים קבועים וניידים.- ארונות, ספרייות וכוונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-קומה ממ"ד יא-ארון לא מקובע- - -



26/2/2023 9:02

מפגעים -מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות-1-פרוזדור קומהמשכבה י"א-מצנן מים לא מקובע- - -

5.7-קבועים וניידים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, -2-תקרה קומה ב שכבה יא-יחידות מנרליות בתקרה לא יציבות- - -
 5.10-26/2/2023 9:05 מפגעים קבועים וניידים-רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



9.5-26/2/2023 מפסקים ושקעים- כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-2-שכבה י-מתג כיבוי אש נתלש מהקיר- - -
 9:17



9.5-26/2/2023 9: 24

-מפסקים ושקעים.-כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-כתה לחינוך מיוחד י 6-אילתורי חשמל-סכנת שריפה- - -



9.5-26/2/2023 9: 26

-מפגעים קבועים - .ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-כתה לחינוך מיוחד י 6-ארון מתכת לא מקובע- - -




9.5-26/2/2023 9: 54


-מפסקים ושקעים.-כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-2-שכבה ח קומה ב-ארון חשמל בפרוזדור ללא שילוט- - -




דרכי הגישה אל הכניסות למקלט ואל היציאות ממנו, לרבות היציאות מפתחי 1-ממד קומה ב שכבה ח-ידית הפעלה ללא כיסוי - - -
יציאות החירום תהיינה פנויות, מסומנות ומשולטות, סלולות או מרוצפות, ללא בליטות או שקעים, בגימור מחוספס למניעת החלקה ופנויות מכל מכשול או הפרעה לתנועה מהירה
6.3-26/2/2023 9: 58 דרכי גישה- וחלקה

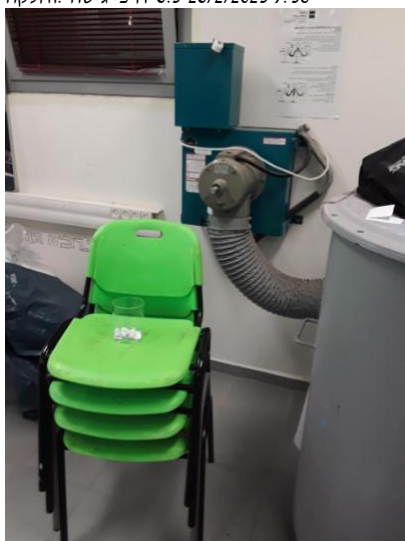

ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת 2-שרותי בנים קומה א שכבה ז-גלאי אש שבור - - -
מכר, 523 יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. 1. בכל גן ילדים יותקנו 2 מטפי אבקה 6 ק"ג כל אחד. 2. במרחק שלא יעלה על 90 מ' מהגן יותקן ברז כיבוי 2 " או 3 " 3. בחזית הכניסה למבנה
4. X80X30 תוצב עמדת כיבוי אש הכוללת ברז שרפה " 2, גלגלון " $\frac{3}{4}$ של 15 מ' עם מוזנק, זרנוקים של 15 מ' כל אחד, וכן מטף כיבוי אש המכיל אבקה יבשה 6 ק"ג כל אלה יהיו בארון 120
4.5-26/2/2023 10:05 ציוד ומטפי כיבוי אש-. במידת הצורך, יותקנו גלגלונים כיבוי נוספים כך שיינתן כיסוי לכל שטח הגן

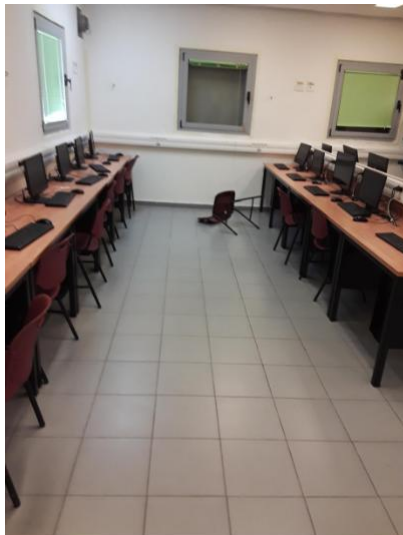


ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת 1-מעבדת מחשבים-מעבדה ללא מטף כיבוי אש- - -
 4.4-ציוד ומטפי כיבוי אש-גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523
 26/2/2023 10: 10

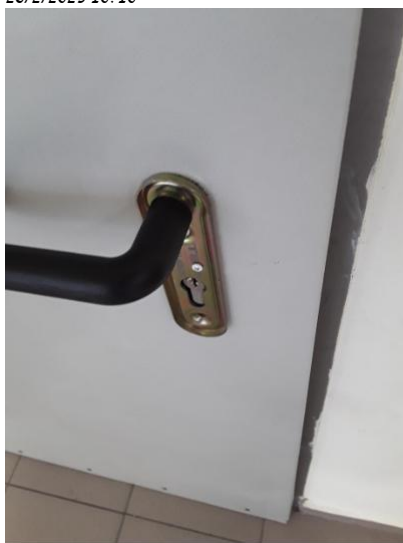

הידיות, המנעולים או חיפויים "(רוזטות)" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטות 2-דלת מעבדה ביאולוגיה-חוסר בסיסיות מגן- - -
 5.24-26/2/2023 10: 14 דלתות-ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים



כנפי החלונות לא יבלטו לתוך הכיתה/ גן. כנפי החלונות לא יבלטו החוצה 1-מעבדה לכימיה-חלון פתוח לרווחה ללא הגבלה- - -
 5.14-26/2/2023 10: 27 חלונות סורגים-. כאשר סף החלון נמוכה מ 2 מטרים במידה ובולטים, יש לקבעם במצב פתוח

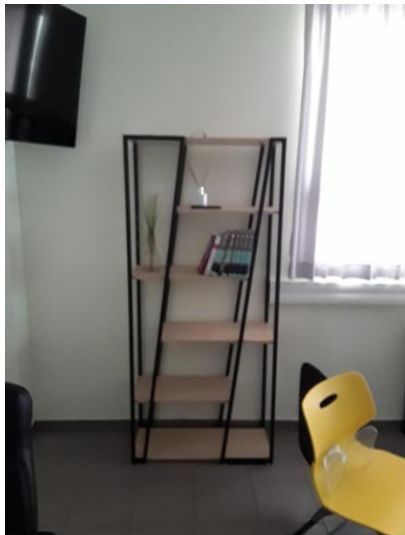

מפגעים - ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-חדר מחשבים מבנה מעבדות-ארונית לא מקובעת- - - -
5.5-26/2/2023 10: 32 קבועים וניידים
