

ב' 15/4/2024

בית ספר חופית


הרי גולן 4 אשדוד רובע יא
613703
088640650

סיכום מבדק שנתי מבדקי בטיחות מנהל חינוך

מומנתקן - שי ביאזי ו' 15/3/2024 13:02

פרטי המוסד	
סמל המוסד	613703
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר חופית
כתובת המוסד	הרי גולן 4
טלפון המוסד	088640650
פרטי המנהל/ת	מורן בן יהודה
תאריך המבדק	ו' 15/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	✓
	פעם ב - 1 שנים		
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1	15/3/2024	✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים		
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	15/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים		
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	15/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	15/3/2024	✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים		
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1	15/3/2024	✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים		

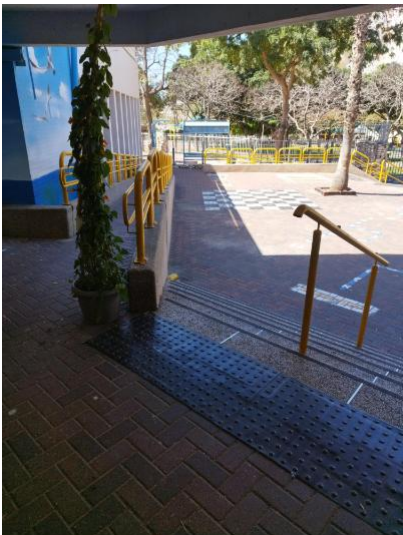תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
15/3/2024 11:10	5.3 6	מעקים ומסעדים	מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך . המדרגות	2	איזור כניסה וגרם מדרגות מבנה	חסרים 2 מסעדי יד- בגרם המדרגות על הקירות באיזור כניסה. בגרם מדרגות במבנה חסר בצד אחד בשני גרמי המדרגות	
							
							
15/3/2024 11:21	9.5	מפסקים ושקעים	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	1	כיתה 10, 11, 7	בקבוצת שקעים יש אלמנט הגנה חסר יש גישה לחוטי חשמל מבפנים	



מונח ארון לא
מקובע לקיר
למניעת התהפכות

כיתה 10

1 ארונות, ספריות
וכונניות יהיו
מקובעים למניעת
התהפכות.

מפגעים
קבועים וניידים

5.5

15/3/2024
11:22

מרצפות חסרות
במרכז הכיתה הן
מספר אירוע נפילה
של תלמידים ומורות

כיתה 5

1 לא יהיו מפגעי
תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה,
רצפות שקועות,
סימני רפיון (כגון
"בטן") בתקרות
תלויות ומפגעי
תשתית אחרים.

מפגעים
קבועים וניידים

5.1
0

15/3/2024
11:41



חסרים שלטי יציאה
מוארים הכנה
לחירום

גרמי מדרגות
ופתחי היציאה
מהמבנה

2

מסלולי המילוט
ישלטו בשלטים
סטנדרטיים
המצביעים על
כיוון היציאה. מעל
כל פתחי המילוט,
הכניסות-לחדרי
המדרגות ושערי
היציאה החיצוניים
יוצבו שלטי יציאה
ותותקן תאורת
חירום;

הכנה למילוט

4.1
7

15/3/2024
12:07

מותקנת תאורה
פלורוסנטית מסוג
מתנפץ ללא הגנה

מספר כיתות

2

גופי התאורה יוגנו
מפני שבירה
ופגיעות
באמצעות
התקנתם
בשקעים, או על-
ידי שימוש בגופי
תאורה מדגמי
"אנטי-ונדל"
(יבדק בבדיקת
רישוי.)

תאורה

11.
7

15/3/2024
12:09



ארונות לא
מקובעים לקיר
למניעת התהפכות

כיתות 7,9,5

1 ארונות, ספריות
וכונניות יהיו
מקובעים למניעת
התהפכות.

מפגעים
קבועים וניידים

5.5

15/3/2024
12:10

דלתות מקלטים
חסר תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח
דלת חדר שילוב
ודלתות שירותים
במבנה חסרים
מנגנוני האטה

דלתות

1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם
יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתה.
ג. מעצור דלת
במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת. ה.
בדלתות קלות של
שירותים נדרשת
הגנה מתאימה.

דלתות 5.2
3

15/3/2024
12:13



סולמות ללא מניעת
גישה לילדים

מקלטים

2

בכל מקום בו
קיימת סתירה בין
הוראות פיקוד
העורף והוראות
הבטיחות, בזמן
שגרה יגברו
הוראות הבטיחות
תוך כדי מתן
אפשרות מהירה
לעבור למצב
חירום. כקיבוע או
סורגים על חלונות
מילוט, ומניעת
טיפוס על
סולמות.

שגרה (לא
בחירום)

6.1

15/3/2024
12:16

אין סימון מרווחים-
כלל אפשרות
לילדים להיתקל
בקירות במרוצתם -
קיים מגננון אחזקת
רשת כדור עף בולט
מהווה חשש
לפגיעת תלמידים
במרוצתם

אולם ספורט

1

ישמרו שולים
נקיים ברוחב
מינימאלי של:
(כדורגל, קט רגל
וכדור עף -3
מטר) (כדורסל- 2
מטר). (כדור יד
2- מ' לרוחב
האולם, 1 מ'
לאורך האולם).
עצמים בולטים,
ברזיות,
הידראנטים,


ארגון אולם

11.

1

15/3/2024
12:49

עמודי תאורה,
לוחות חשמל
כיו"ב -יורחקו
משולי מגרשי
הספורט.

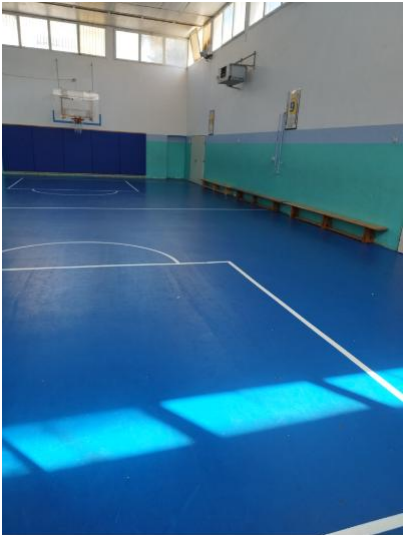

15/3/2024 12:52	3.5 5	מגרשי ספורט	ישמרו שולים נקיים ברוחב מינימאלי של (כדורגל, קט רגל וכדור עף-3 מטר) (כדורסל-2 מטר). (כדור יד-2 מ' רוחב האולם, 1 מ' לאורך האולם). עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, מודי תאורה, לוחות חשמל, וכיו"ב - יורחקו משולי מגרשי הספורט.	2	מגרש ספורט	לא מסומנים מרווחי שוליים במגרש
--------------------	----------	-------------	--	---	------------	-----------------------------------

15/3/2024 12:55	3.1 1	ארגון החצר	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	2	חצר	קיימים אבני שפה בחצר מהווים מכשול לתלמידים. מאב הבית נמסר שמספר תלמידים נפלו מאבנים אלו
--------------------	----------	------------	--	---	-----	--



גובה הגדר שנמדד
ממדרך רגל 150
ס"מ בנוסף מוטות
ברזל בחלק העליון
של הגדר מהווים
סכנת הילכדות
ראש/ צוואר

גדר היקפית

2

הגדר תתנשא
לגובה של 2 מ'
לפחות מעל פני
הקרקע משני
צידי הגדר, הגובה
יימדד מעל
לנקודת מדרך
רגל

גדר 3.2
6

15/3/2024
12:59

