

ב' 15/4/2024

בית ספר קשת

תשרי 11 אשדוד רובע יב

614958

088649618

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי

מומנתקן - שי ביאזי		י' 29/3/2024 12:38
פרטי המוסד		
סמל המוסד	614958	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר קשת	
כתובת המוסד	תשרי 11	
טלפון המוסד	088649618	
פרטי המנהל/ת	לילך לוי	
תאריך המבדק	י' 29/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	29/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	29/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	29/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים	29/3/2024	✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-100 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים		
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	29/3/2024	✓
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	29/3/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	המצא	תמונה
29/3/2024 11:11	5.2 4	דלתות	הידיות, המנעולים או חיפויים "רוזטות" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים.	1	שירותי בנים מבנה 1	ידית דלת תא שירותים שבורה וחדה	
29/3/2024 11:13	9.5	מפסקים ושקעים	כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם.	1	(כיתה 28 ו1)	חסר מכסה לשקע חשמל	
29/3/2024 11:31	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	1	תשתית	מבנה כיתות א שירותי בנים, - משקוף רקוב מחלודה עם קצה חד, רצפות שבורות ומתרוממות סוג הרצוף מחליק מאוד בשירותי בנים ובנות.	



נבנה קונסטרוקטה מעץ שתי קומות בהם קיימים מספר מפגעים / תרחישים אפשריים. -בחלק התחתון איזור מדורג מתחת למדרגות חשש לפגיעה לילדים (לסגור גישה). - חשש מטיפוס ילדים על הקונסטרוקציה	מבנה דרומי מסדרון קומה ראשונה	1	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	מפגעים קבועים וניידים	5.1 0	29/3/2024 12:06
---	-------------------------------	---	--	-----------------------	----------	--------------------



ונפילה (לסגור
אפשרויות טיפוס
(-בחלק העליון
נמצאו שולחן
וכיסאות ניידים
מאפשר עליה
עליהם וצימצום
גובה המעקה)
להסיר ציוד נייד /
להתקין ציוד נייד
שלא ליידי איזור
המעקה) סכנת
נפילה.





דלתות כניסה
לשירותים - ללא
מנגנוני האטה.
דלתות מקלט -
ללא תפס להחזקת
הדלת במצב פתוח

דלתות

1 הדלתות תצוידנה
באבזר או
באבזרים לצורך
המטרות הבאות:
א. מגן אצבעות
בשני צידי הצירים
באזורים שבהם
יש אפשרות
להילכדות
אצבעות. ב.
האטת אגף הדלת
במהלך סגירתו.
ג. מעצור דלת
במצב פתוח.
האבזר יותקן
בקיר, בגובה אגף
הדלת ולא
ברצפה. ד.
במקלט ובמרחב
מוגן יש להתקין
מגן אצבעות
ואלמנט קיבוע
שיותאם לדלת.
ה. בדלתות קלות
של שירותים
נדרשת הגנה
מתאימה

דלתות 5.2
3

29/3/2024
12:09

גדר רשת פנימית
משוחררת

מגרש כדורסל

2 גדר סורגים יש
לייצב בבסיס
בטון. הסורגים
יהיו אנכיים,
במרווחים של לא
יותר מ- 10 ס"מ
בין מוטות סמוכים
ובחזק הדרוש
למניעת כיפופם

גדר 3.2
7

29/3/2024
12:11



אבנים משתלבות-
מסביב לעצים
בולטות סומנו
בצבע -פתחי ביוב
בולטים מגובה
קרקע

חצר


1

החצר תהיה
נקייה ממפגעי
בטיחות קבועים
או זמניים, ללא
בליטות או
שקעים, ולא
יישארו בה
מכשולים או
פסולת מכל סוג .
חלקים בולטים
יהיו עם הגנה
עליהם .

תשתיות

3.1

29/3/2024
12:14

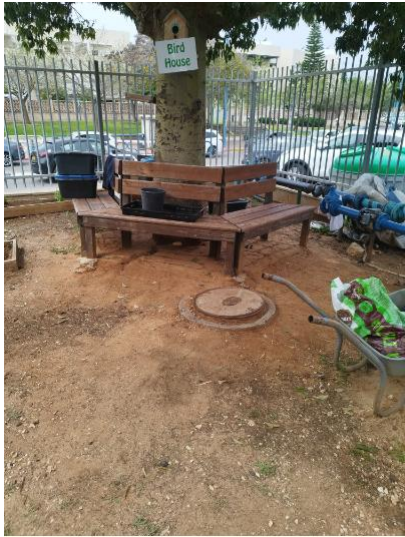

חוסרים נקודתיים במשטחי דשא סינטי חשש מעידה	דשא סינטי	1	החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים.	ארגון החצר	3.1 1	29/3/2024 12:17
---	-----------	---	--	------------	----------	--------------------

	
	29/3/2024 12:20 5.1 0 מפגעים קבועים וניידים לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים. 1, 2 כיתה חיצונית אריח שבור בכניסה לכיתה
	29/3/2024 12:23 3.6 תשתיות מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את הילדים, יגודרו באופן שימנע גישה אליהם או טיפוס עליהם, הדרך תהיה פנויה ממכשולים. 1, 2 חצר צינורות מים ראשית למבנה ללא גידור למניעת גישה



29/3/2024 12:26 4.1 7 הכנה למילוט 2 אולם ספורט שלטי יציאה מוארים שבורים/חסרים

מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות-לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום;

29/3/2024 12:38 3.1 1 ארגון החצר החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים. 1 איזור כניסה למבנה ראשון ערוגות מאבן 2 בולטות מגובה הקרקע 20 ס"מ נמסר שהיו מספר נפילות / היתקלויות של ילדים באיזור

