

ב' 15/4/2024

בית ספר שקד
המלך רחבעם 15 אשדוד רובע יג
614115
088646138

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי


מומנתקן - שי ביאזי		ג' 19/3/2024 14:56
פרטי המוסד		
סמל המוסד	614115	
סוג המוסד	בית ספר	
שם המוסד	בית ספר שקד	
כתובת המוסד	המלך רחבעם 15	
טלפון המוסד	088646138	
פרטי המנהל/ת	אורלי ביטון	
תאריך המבדק	ג' 19/3/2024	
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא	
המבנה מאושר לשימוש	כן	
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי	
חתימת עורך המבדק		

מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	✓
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	✓
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	19/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה			✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	19/3/2024	✓
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	19/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	19/3/2024	

תמונה	הממצא	מיקום	קדימו ת	תאור	סעיף	תחום	תאריך/שעה
	גובה הגדר ממדרג רגל 150 ס"מ ובחלקה העליון ישנם אלמנטים חדים	גדר היקפית	2	הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרג רגל	3.2 6	גדר	19/3/2024 14:08
	שיחים קוצניים שטולה בחצר	חצר	2	צמחיה במוסד- לא תימצא צמחיה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפוס עליהם	3.1 8	ארגון החצר	19/3/2024 14:37
	משקופי שירותים חלודים עם קצוות חדים בחלקם התחתון	מבנה ב, ג בקומות קרקע	2	לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.	5.1 0	מפגעים קבועים וניידים	19/3/2024 14:39
	מקלטים - חסר תפס להחזקת הדלת במצב פתוח. דלתות כיתות - קיימים מספר דלתות עם מנגנון האטה לא מכוון	דלתות	1	הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם	5.2 3	דלתות	19/3/2024 14:42



יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיוטאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה.

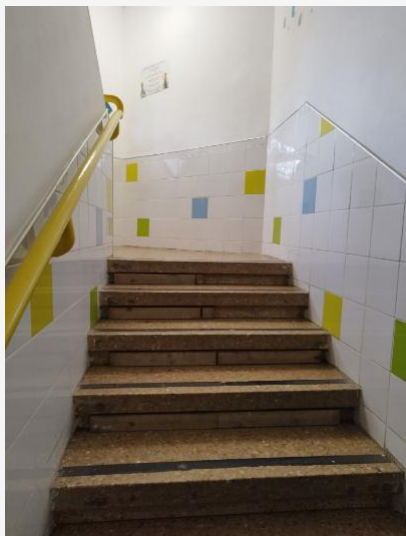

חסרים מאחזי יד בין קומות קרקע לקומה שנייה

בניין ב, ג

2

מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות

מעקים ומסעדים

5.3
6

19/3/2024
14:43



מותקנת תאורה פלורוסנטית מסוג מתנפץ ללא הגנה

גורף כיתות ומסדרונות

2

גופי התאורה יוגנו מפני שבירה ופגיעות באמצעות התקנתם בשקעים, או על-ידי שימוש בגופי תאורה מדגמי "אנטי-ונדל" ("יבדק בבדיקת רישוי").

תאורה

11.
7

19/3/2024
14:47

בין בניין ב' לבניין א - אבנים משתלבות שקועות בכניסה למבנה א - דשא סינטטי מקופל עלול להוות מכשול


חצר 1, 1

החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם.

תשתיות

3.1

19/3/2024
14:50

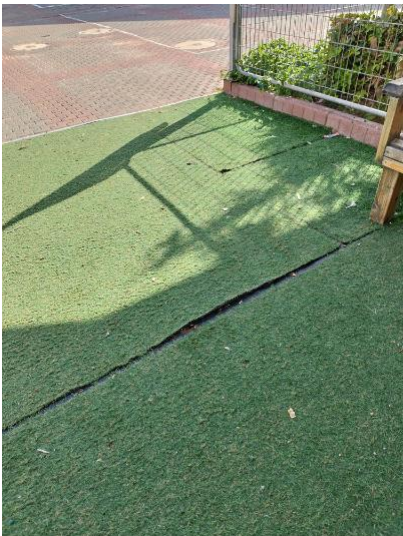

ספסל שבור עם
חלקי עץ חדים

חצר

1

חלקי העץ יהיו
חלקים וללא
כפיסים העלולים
לגרום לפציעה

מתקני
משחקים

3.4
9

19/3/2024
14:52

חלון במסדרון
נפתח במלואו
מגביל פתיחה שבור

בניין ג קומה
שנייה

1

חלונות החוץ של
חדרי הלימוד
ואולמי
ההתקהלות
י"קבעו באופן
שגובה הסף
שלהם מהרצפה
יהיה - 1.50 מ'
לפחות. במידה
וגובה סף חלון
יפחת מ-1.5 מטר
והותקנו התקנים
ל"הגבהת הסף

חלונות סורגים

5.1
3

19/3/2024
14:53



או הגבלת פתיחת
החלון, המרווח
הנוצר לא יעלה
על 10 ס"מ.
רוחב אדן החלון
כלפי פנים לא
יעלה על 4 ס"מ
למניעת ישיבה.
חלונות יזוגו
בחומר שאינו
מתנפץ
